


EPFNA DÉCONSTRUCTION KENNEDY & PELLETAN

Retour d'Expérience et bilan

CONTEXTE



Déconstruction de logement à
Cenon : Rue Pelletan et Rue
Kennedy




ACTEURS DU PROJET

MOA	EPF NA
Economie Circulaire	Neo-Eco
MOE	AD Ingé
Entreprise travaux	Avenir Déconstruction



DÉMARCHE D'INTÉGRATION DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

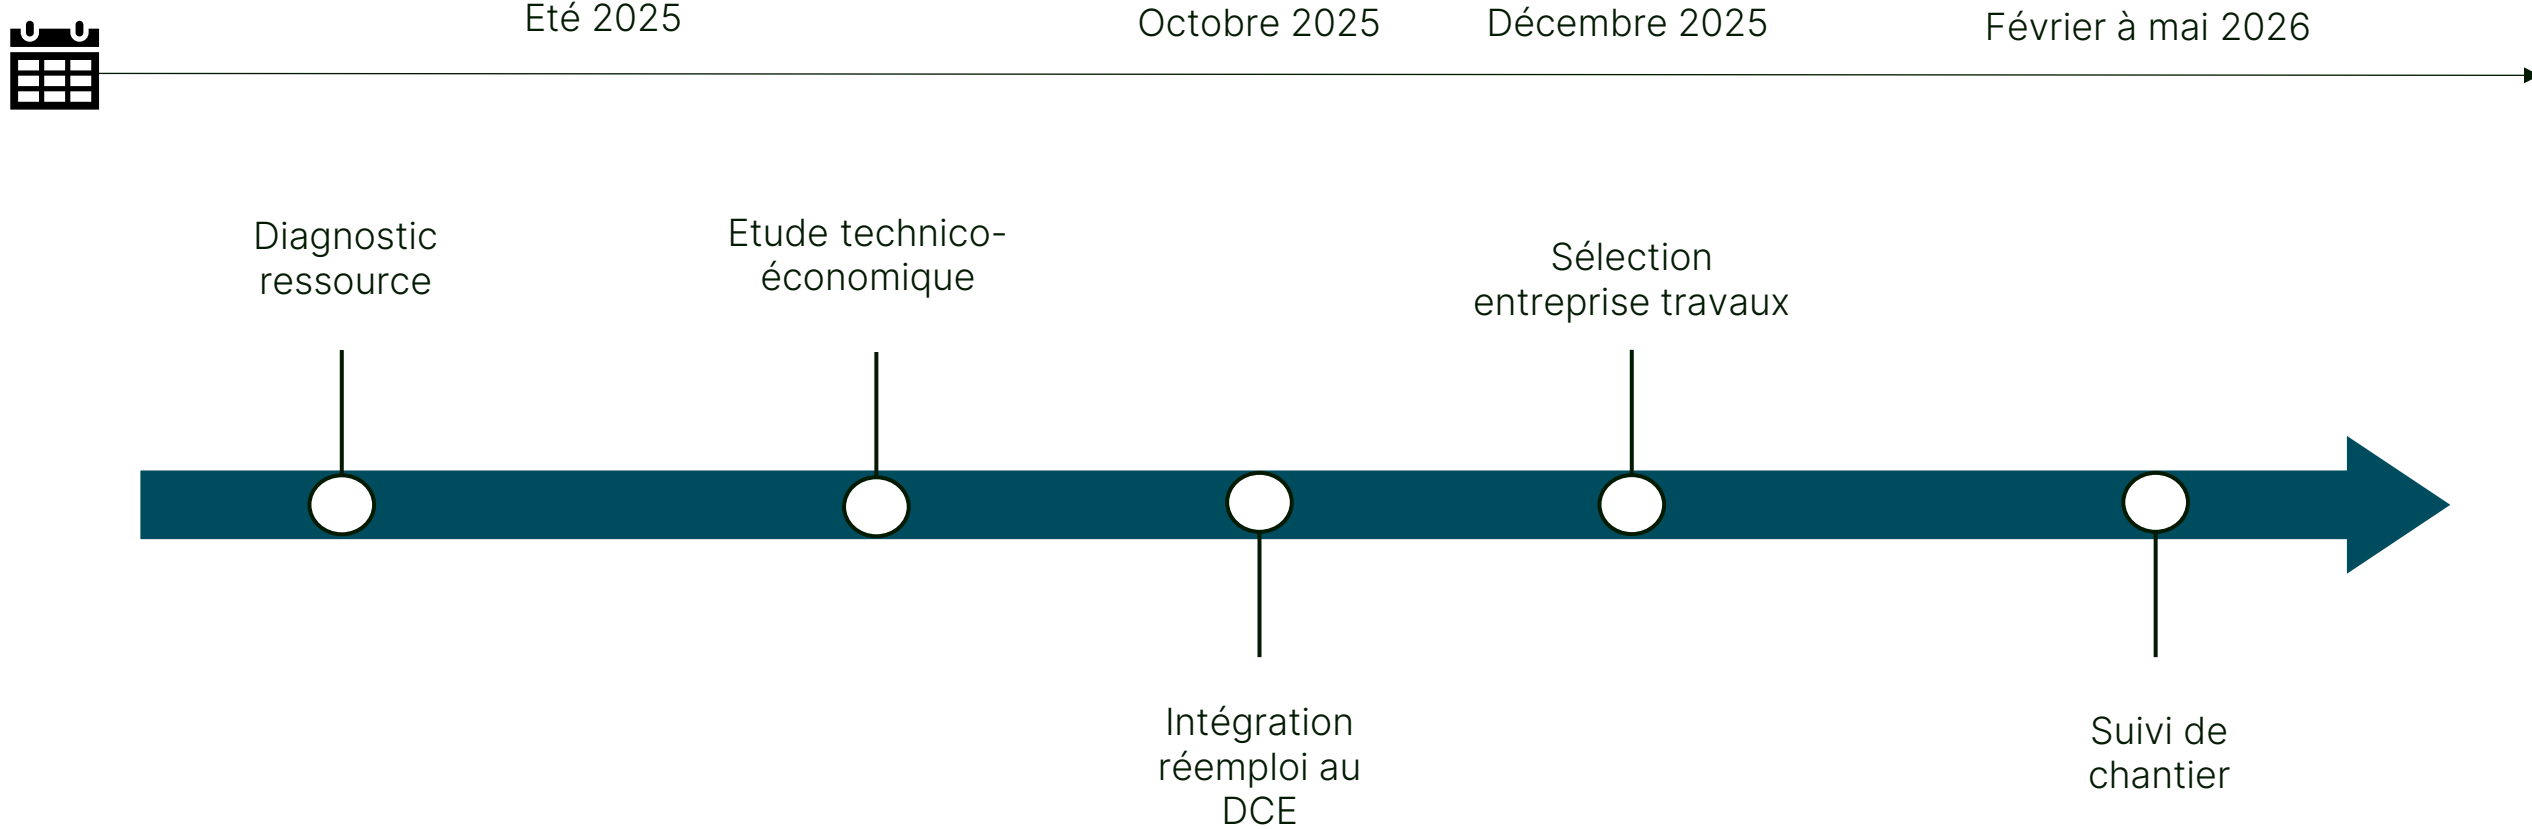



1

PHASE ÉTUDE

EN AMONT DE LA DÉCONSTRUCTION



Identification des éléments à réemployer

N°	ELEMENTS	QUANTITE
1	Structure porche extérieur bois	1 ens
2	Lambris bois	15 m²
3	Ferronnerie	1 u
4	Tuile toiture 56	112 m²
5	Tuile stock 54	50 à 75 u
6	Volet PVC	5 u
7	Parquet bois	45 m²
8	Charpente bois	1 ens

Peu d'éléments à réemployer mais avec une forte valeur ajoutée et une forte de demande sur le marché du réemploi

FICHE N°01

Porche bâtiment 56

STRUCTURE PORCHE EXTÉRIEUR

Disponibilité : Fin 2025 / Début 2026



1 - poteaux	19 cm x 19 cm H = 2,5m
	60 kg/u
	2 u
2 - poutres	22x7x200 cm
	20 kg/u
	2 u
3 - poutres	21x7x250 cm
	24 kg/u
	5 u
Matériau	Bois
Aspect	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : à la pelle mécanique ou manuelle avec assistance mécanique.


Stockage : Stockage sur rack
A stocker hors d'eau

Domaine d'emploi potentiel : Bois
structurel : à valider après
caractérisation

Réutilisation du bois pour autres usages

DIAGNOSTIC RESSOURCE

Photos

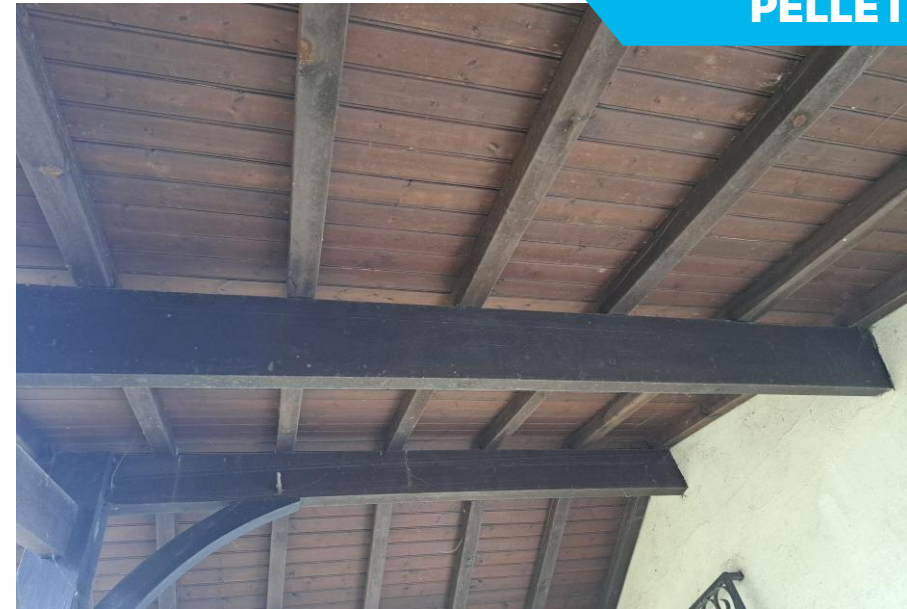


PELLETAN



DIAGNOSTIC RESSOURCE


Quantification des déchets

Type de déchets	Matériau	Typologie associée	Quantité estimée	Filière de fin de vie préconisée
 Déchets Inertes	Béton / Parpaing / Brique	Murs béton et parement brique Dalle béton	101,5 t	Recyclage matière en filière VRD
	Céramique	Faïence Sanitaires	0,7 t	Recyclage matière en filière VRD
	Terre cuite	Couverture	6 t	Réemploi Recyclage matière en filière VRD
 Déchets Non dangereux	Bois	Bois A Bois B	28,3 t	Réemploi Recyclage matière en filière bois
	Complexes	Brique plâtrière Isolation polystyrène	12,2 t	Recyclage matière Valorisation énergétique
DD	DD	Déchets amiantés/plomb	0,1 t	Enfouissement

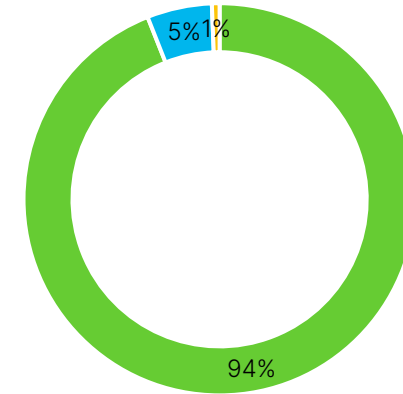

■ BETON/BRIQUE ■ TERRE CUITE ■ CERAMIQUE

■ BOIS ■ AUTRES

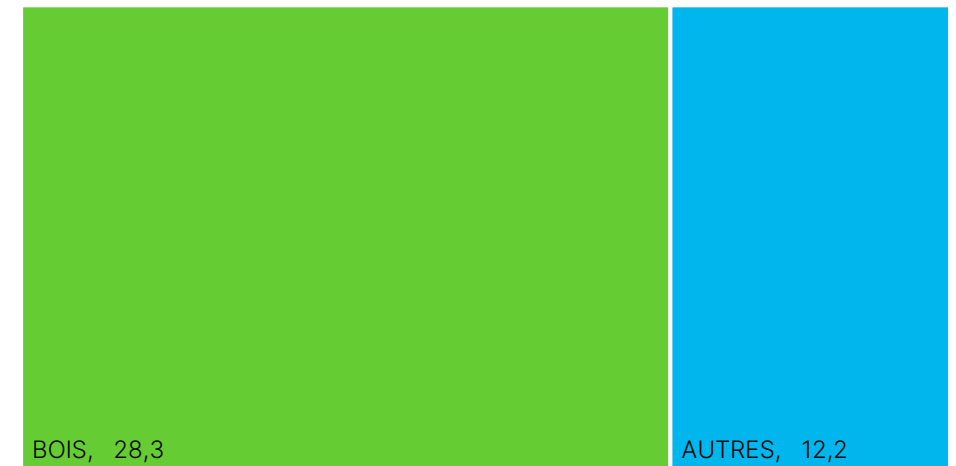

Les scénarios

L'objectif de l'étude est de comparer des scénarios avec des niveaux d'ambitions de valorisation par recyclage et réemploi différents. Les scénarios sont proposés basés sur les filières existantes en région Nouvelle Aquitaine et les pratiques de réemploi actuelles.

	Scénario 0	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 2 bis
REEMPLOI	Pas de réemploi	Pas de réemploi	Environ 50% des ressources identifiés	100% des ressources identifiés
RECYCLAGE	Déchets inerte : VRD Valorisation bois	Déchets inerte : VRD Valorisation bois Brique plâtrière en filière spécifique	Déchets inerte : VRD Valorisation bois Brique plâtrière en filière spécifique	Déchets inerte : VRD Valorisation bois Brique plâtrière en filière spécifique
	<i>Recyclage</i> 92% <i>Réemploi</i> 0%	<i>Recyclage</i> 99% <i>Réemploi</i> 0%	<i>Recyclage</i> 93% <i>Réemploi</i> 7%	<i>Recyclage</i> 86% <i>Réemploi</i> 14%

DIAGNOSTIC FINANCIER

Modélisation des scénarios de réemploi

PHASE	METHODE	SCENARIO DE REFERENCE				SCENARIO 1 - Objectif modérés				SCENARIO 2 - Objectifs ambitieux			
		Quantité	Unité	Prix total fourchette basse	Prix total fourchette haute	Quantité	Unité	Prix total fourchette basse	Prix total fourchette haute	Quantité	Unité	Prix total fourchette basse	Prix total fourchette haute
DEPOSE	Dépose soignée pour réemploi	-	€	-	€	3 410 €		5 050 €		6 375 €		9 295 €	
	Structure porche extérieur bois	-	ens	-	€	1	ens	840 €	1 200 €	1	ens	840 €	1 200 €
	Lambris bois	-	m²	-	€	-	m²	-	€	15	m²	375 €	375 €
	Ferronnerie	-	u	-	€	-	u	-	€	1	u	20 €	20 €
	Tuile toiture 56	-	m²	-	€	56	m²	560 €	840 €	112	m²	1 120 €	1 680 €
	Tuile stock 54	-	u	-	€	60	u	-	€	60	u	-	€
	Volet PVC	-	u	-	€	-	u	-	€	4	u	-	€
	Parquet bois	-	m²	-	€	34	m²	510 €	510 €	68	m²	1 020 €	1 020 €
	Charpente bois	-	ens	-	€	1	ens	1 500 €	2 500 €	1	ens	3 000 €	5 000 €
	Dépose conventionnelle	3 411 €		5 571 €		1 573 €		2 603 €		-		-	
	Structure porche extérieur bois	1	ens	500 €	600 €	-	ens	-	€	-	ens	-	€
	Lambris bois	15	m²	225 €	225 €	15	m²	225 €	225 €	-	m²	-	€
	Ferronnerie	1	u	10 €	10 €	1	u	10 €	10 €	-	u	-	€
	Tuile toiture 56	112	m²	336 €	896 €	56	m²	168 €	448 €	-	m²	-	€
	Tuile stock 54	60	u	-	€	-	u	-	€	-	u	-	€
	Volet PVC	4	u	-	€	4	u	-	€	-	u	-	€
	Parquet bois	68	m²	340 €	340 €	34	m²	170 €	170 €	-	m²	-	€
	Charpente bois	1	ens	2 000 €	3 500 €	1	ens	1 000 €	1 750 €	-	ens	-	€
TOTAL		3 411 €		5 571 €		4 983 €		7 653 €		6 375 €		9 295 €	
Cout moyen global		4 491 €		6 318 €		7 835 €							

Les coûts présentés dans le tableau proviennent de retour d'expérience Neo Eco et de bibliographie théorique, il est à noter que la différence entre la fourchette basse et la fourchette haute est importante car le réemploi est une pratique encore récente sur le territoire et en fonction des entreprises, les prix estimés peuvent être très variables.

+41%

+74%

CATEGORIE	MATERIAUX
DI	Inerte en mélange
	Céramique
	Terre cuite
	TOTAL
DND	Bois
	Brique platrière
	Mélange DND
	TOTAL
Cout total de gestion des déchets	
REEMPLOI	Dépose conventionnelle
	Dépose soignée pour réemploi
	TOTAL
Cout total déchets + réemploi	
Cout moyen global	

Scénario 0					
Quantité	Prix total Fourchette basse			Prix total Fourchette haute	
	t	€/t	Total	€/t	Total
105	105	0 €	0 €	3 €	314 €
	1	0 €	0 €	3 €	2 €
	6	0 €	0 €	3 €	18 €
	111	0,00 €		333,51 €	
28	28	40,0	1 131 €	80,0	2 261 €
	12	180,0	2 075 €	250,0	2 881 €
	1	180,0	116 €	250,0	161 €
	40	3 321,26 €		5 303,81 €	
		3 321,26 €		5 637,32 €	
		3 411,0	5 571,0		
		0,0	0,0		
		3 411,00 €		5 571,00 €	
		6 732,26 €		11 208,32 €	
		8 970,29 €			

Scénario 1 - Tri 7 flux					
Quantité	Prix total Fourchette basse			Prix total Fourchette haute	
	t	€/t	Total	€/t	Total
105	105	0 €	0 €	3 €	314 €
	1	0 €	0 €	3 €	2 €
	6	0 €	0 €	3 €	18 €
	111	0,00 €		333,51 €	
28	28	40,0	1 131 €	80,0	2 261 €
	12	80,0	922 €	120,0	1 383 €
	1	180,0	116 €	250,0	161 €
	40	2 168,68 €		3 805,45 €	
		2 168,68 €		4 138,96 €	
		3 411,0	5 571,0		
		0,0	0,0		
		3 411,00 €		5 571,00 €	
		5 579,68 €		9 709,96 €	
		7 644,82 €			

-15 %

Scénario 2 - réemploi modéré					
Quantité	Prix total Fourchette basse			Prix total Fourchette haute	
	t	€/t	Total	€/t	Total
105	105	0 €	0 €	3,0	314 €
	1	0 €	0 €	3,0	2 €
	3	0 €	0 €	3,0	10 €
	108	0,00 €		325,44 €	
20	20	40,0	819 €	80,0	1 639 €
	12	80,0	922 €	120,0	1 383 €
	1	180,0	116 €	250,0	161 €
	33	1 857,48 €		3 183,05 €	
		1 857,48 €		3 508,49 €	
		1 573,0	2 603,0		
		3 410,0	5 050,0		
		4 983,00 €		7 653,00 €	
		6 840,48 €		11 161,49 €	
		9 000,98 €			

0%

Scénario à préconiser dans le marché travaux

Scénario 2 - réemploi total					
Quantité	Prix total Fourchette basse			Prix total Fourchette haute	
	t	€/t	Total	€/t	Total
105	105	0 €	0 €	3,0	314 €
	1	0 €	0 €	3,0	2 €
	0	0 €	0 €	3,0	0 €
	105	0,00 €		315,65 €	
13	13	40,0	522 €	80,0	1 044 €
	12	80,0	922 €	120,0	1 383 €
	1	180,0	116 €	250,0	161 €
	25	1 560,28 €		2 588,65 €	
		1 560,28 €		2 904,30 €	
		0,0	0,0		
		6 375,0	9 295,0		
		6 375,00 €		9 295,00 €	
		7 935,28 €		12 199,30 €	
		10 067,29 €			

+12%

N°	ELEMENTS	QUANTITE
1	Tuile toiture	444 m²
2	Garde-corps	8 ml
3	Parquet bois	70 m²
4	Charpente bois	444 m²

FICHE N°08



Charpente de l'ensemble des bâtiments

CHARPENTE BOIS

Disponibilité : Fin 2025 / Début 2026



Quantité	≈ ég. 112 m²
3 poutres	Section 7 x 21 cm
Poids indicatif	100 kg/m²
Matériau	Bois
Aspect	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépense : à la pelle mécanique ou manuelle avec assistance mécanique.

Stockage : Stockage sur rack
A stocker hors d'eau

Réemploi : Potentiel
Réutilisation : fort potentiel




Diagnostic Ressources – septembre 2025



DIAGNOSTIC RESSOURCE

Quantification des déchets

Type de déchets	Matériau	Typologie associée	Quantité estimée	Filière de fin de vie préconisée
 Déchets Inertes	Béton / Parpaing / Brique	Murs béton et parement brique Dalle béton	493,4 t	Recyclage matière en filière VRD
	Céramique	Faïence Sanitaires	2,4 t	Recyclage matière en filière VRD
	Terre cuite	Couverture	22,3 t	Réemploi Recyclage matière en filière VRD
 Déchets Non dangereux	Bois	Bois A Bois B	65 t	Réemploi Recyclage matière en filière bois
	Métaux	Divers	1,7 t	Réemploi garde-corps Recyclage matière en filière métaux
	Plâtre	Cloison	1,7 t	Recyclage matière
	Plastique	Revêtement	0,2 t	Recyclage matière
	Menuiserie	Bois et PVC	2,0 t	Envois en filière de démantèlement
	Complexes	Brique plâtrière Isolation polystyrène	29,2 t	Recyclage matière Valorisation énergétique
DEEE	DEEE	Equipement électrique	0,1 t	Reprise REP / recyclage
DD	DD	Déchets amiantés/plomb	1,5 t	Enfouissement

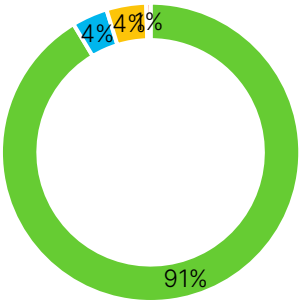

■ PARPAING/BRIQUE ■ BETON ■ TERRE CUITE ■ CERAMIQUE

■ BOIS ■ METAUX ■ PLATRE ■ PLASTIQUE ■ MENUISERIE ■ AUTRES



Les scénarios

L'objectif de l'étude est de comparer des scénarios avec des niveaux d'ambitions de valorisation par recyclage et réemploi différents. Les scénarios sont proposés basés sur les filières existantes en région Nouvelle Aquitaine et les pratiques de réemploi actuelles.

	Scénario 0	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 2 bis
REEMPLOI	Pas de réemploi	Pas de réemploi	50% des ressources considérées réemployables	100% des ressources considérées réemployables
RECYCLAGE	Déchet inertes : VRD Valorisation bois Valorisation métaux	Déchet inertes : VRD Valorisation bois Valorisation métaux Valorisation plastique Valorisation menuiseries	Déchet inertes : VRD Valorisation bois Valorisation métaux Valorisation plastique Valorisation menuiseries	Déchet inertes : VRD Valorisation bois Valorisation métaux Valorisation plastique Valorisation menuiseries
	Recyclage Réemploi	Recyclage Réemploi	Recyclage Réemploi	Recyclage Réemploi
	94% 0%	95% 0%	93% 3%	89% 5%

		Scénario 0					Scénario 1 - Tri 7 flux					Scénario 2 - réemploi partiel					Scénario 2 - réemploi total				
CATEGORIE	MATERIAUX	Quantité	Prix total Fourchette basse		Prix total Fourchette haute		Quantité	Prix total Fourchette basse		Prix total Fourchette haute		Quantité	Prix total Fourchette basse		Prix total Fourchette haute		Quantité	Prix total Fourchette basse		Prix total Fourchette haute	
		t	€/t	Total	€/t	Total	t	€/t	Total	€/t	Total	t	€/t	Total	€/t	Total	t	€/t	Total	€/t	Total
DECHETS INERTES	Parpaing / Brique	473	0 €	0 €	3 €	1 420 €	473	0 €	0 €	3 €	1 420 €	473	0 €	0 €	3 €	1 420 €	473	0 €	0 €	3,0	1 420 €
	Béton	20	0 €	0 €	3 €	60 €	20	0 €	0 €	3 €	60 €	20	0 €	0 €	3 €	60 €	14	0 €	0 €	3,0	42 €
	Céramique	2	0 €	0 €	3 €	7 €	2	0 €	0 €	3 €	7 €	2	0 €	0 €	3 €	7 €	2	0 €	0 €	3,0	7 €
	Terre cuite	22	0 €	0 €	3 €	67 €	22	0 €	0 €	3 €	67 €	17	0 €	0 €	3 €	51 €	12	0 €	0 €	3,0	35 €
	TOTAL	518	0,00 €		1 554,21 €		518	0,00 €		1 554,21 €		513	0,00 €		1 538,23 €		501	0,00 €		1 504,25 €	
DECHETS NON-INERTES NON-DANGEREUX	Bois	65	40,0	2 600 €	80,0	5 201 €	65	40,0	2 600 €	80,0	5 201 €	54	40,0	2 156 €	80,0	4 313 €	43	40,0	1 712 €	80,0	3 425 €
	Métaux	2	-200,0	-330 €	-50,0	-83 €	2	-200,0	-330 €	-50,0	-83 €	2	-200,0	-330 €	-50,0	-83 €	1	-200,0	-298 €	-50,0	-75 €
	Menuiseries	1	0,0	0 €	2,0	2 €	1	110,0	110 €	130,0	130 €	1	110,0	220 €	130,0	260 €	1	110,0	220 €	130,0	260 €
	Verre	1	180,0	180 €	250,0	250 €	1	110,0	110 €	130,0	130 €	1	110,0	110 €	130,0	130 €	1	110,0	110 €	130,0	130 €
	PVC	28	180,0	5 056 €	250,0	7 022 €	28	120,0	3 371 €	120,0	3 371 €	28	120,0	3 371 €	120,0	3 371 €	28	120,0	3 371 €	120,0	3 371 €
	Brique plâtrière	2	180,0	304 €	250,0	422 €	2	60,0	101 €	80,0	135 €	2	80,0	135 €	120,0	203 €	2	80,0	135 €	120,0	203 €
	Plâtre	0,23	180,0	42 €	250,0	59 €	0	70,0	16 €	100,0	23 €	0	70,0	16 €	100,0	23 €	0	70,0	16 €	100,0	23 €
	Plastique	1	180,0	192 €	250,0	266 €	1	180,0	192 €	250,0	266 €	1	180,0	192 €	250,0	266 €	1	180,0	192 €	250,0	266 €
	Mélange DND																				
	TOTAL	100	8 043,72 €		13 138,80 €		100	6 170,23 €		9 173,45 €		89	5 869,98 €		8 482,95 €		77	5 457,98 €		7 602,95 €	
Cout total de gestion des déchets		11 368,4	8 043,72 €		14 693,01 €		8 448,9	6 170,23 €		10 727,66 €		5 869,98 €		10 021,18 €		5 457,98 €		9 107,20 €			
REEMPLOI	Dépose conventionnelle		3 141,0		5 361,0			3 141,0		5 361,0			678,0		1 293,0			0,0		0,0	
	Dépose soignée pour réemploi		0,0		0,0			0,0		0,0			3 475,0		4 585,0			6 235,0		8 455,0	
	TOTAL		3 141,00 €		5 361,00 €			3 141,00 €		5 361,00 €			4 153,00 €		5 878,00 €			6 235,00 €		8 455,00 €	
Cout total déchets + réemploi			11 184,72 €		20 054,01 €			9 311,23 €		16 088,66 €			10 022,98 €		15 899,18 €			11 692,98 €		17 562,20 €	
Cout moyen global			15 619,37 €					12 699,95 €					12 961,08 €					14 627,59 €			

-19%

-17%


-6%



2

PHASE MARCHE

INTÉGRATION ÉCONOMIE CIRCULAIRE

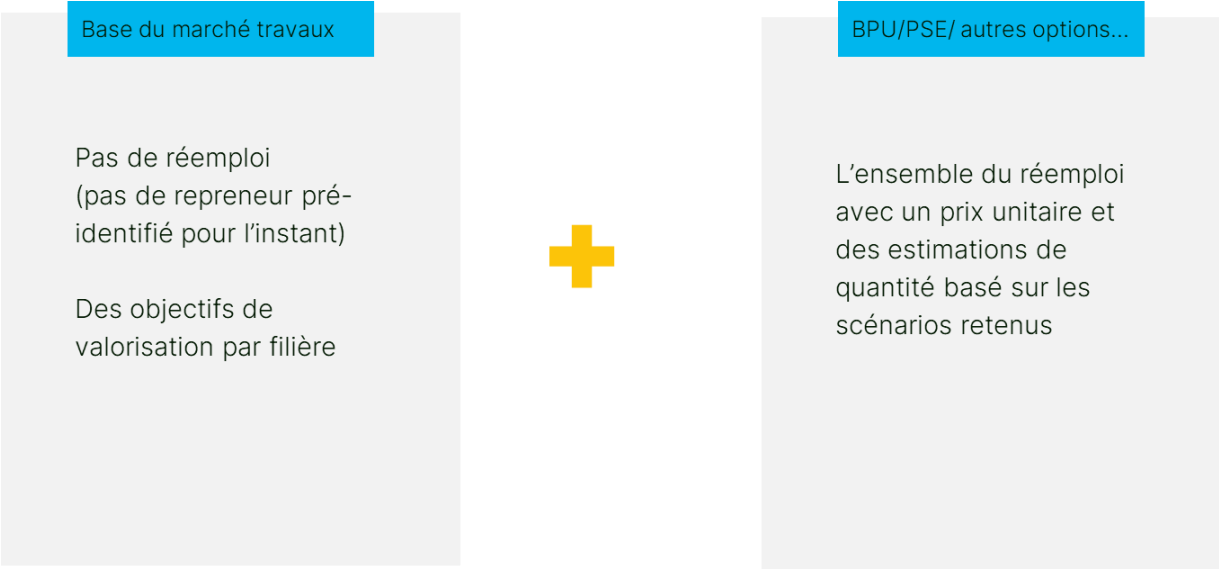

BPU - Réemploi			
	Mission	Unité	PU
1.1	Dépose et conditionnement du porche bois selon prescriptions CCTP	u	
1.2	Dépose et conditionnement des tuiles selon prescriptions CCTP	m²	
1.3	Dépose et conditionnement des parquets bois selon prescriptions CCTP	m²	
1.4	Dépose et conditionnement des éléments de charpente bois selon prescriptions CCTP	u	

TRAITEMENT DES DECHETS						
	Element	Unité	Qté MOA	Qté Entreprise	PU	Prix global
x	Chargement, transport et évacuation des déchets inertes vers la filière de valorisation imposée	t	111			0,00 €
x	Chargement, transport et évacuation des briques plâtrières vers la filière de valorisation adapté	t	12			0,00 €
x	Chargement, transport et évacuation des métaux vers la filière de valorisation imposée	t	1			0,00 €
x	Chargement, transport et évacuation du bois vers la filière de valorisation adéquate	t	28			0,00 €
x	Chargement, transport et évacuation des DND restants vers le centre de traitement adéquat	t	3			0,00 €
TOTAL HT				0,00 €		



ANALYSE DE L'OFFRE RETENUE

% réemploi

2- REEMPLOI					
SITE DE CENON KENNEDY					
DQE 1-11	Dépose et conditionnement des garde-corps selon prescriptions CCTP	ml	8	20,00 €	160,00 €
DQE 1-12	Dépose et conditionnement des tuiles selon prescriptions CCTP	m²	444	12,30 €	5 461,20 €
DQE 1-13	Dépose et conditionnement des parquets bois selon prescriptions CCTP	m²	70	22,40 €	1 568,00 €
DQE 1-14	Dépose et conditionnement des éléments de charpente bois selon prescriptions CCTP	u	10	267,00 €	2 670,00 €
SITE DE CENON PELLETAN					
DQE 1-15	Dépose et conditionnement du porche bois selon prescriptions CCTP	u	10	239,00 €	2 390,00 €
DQE 1-16	Dépose et conditionnement des tuiles selon prescriptions CCTP	m²	112	12,30 €	1 377,60 €
DQE 1-17	Dépose et conditionnement des parquets bois selon prescriptions CCTP	m²	45	22,40 €	1 008,00 €
DQE 1-18	Dépose et conditionnement des éléments de charpente bois selon prescriptions CCTP	u	5	250,00 €	1 250,00 €

15 884 € prévu pour
du réemploi

Budget global
déconstruction (Pelletan,
Kennedy + DQE total)

298 363 €




5% cout travaux
pour le réemploi



3

PHASE CHANTIER

LES PRINCIPES DU CHANTIER CIRCULAIRE

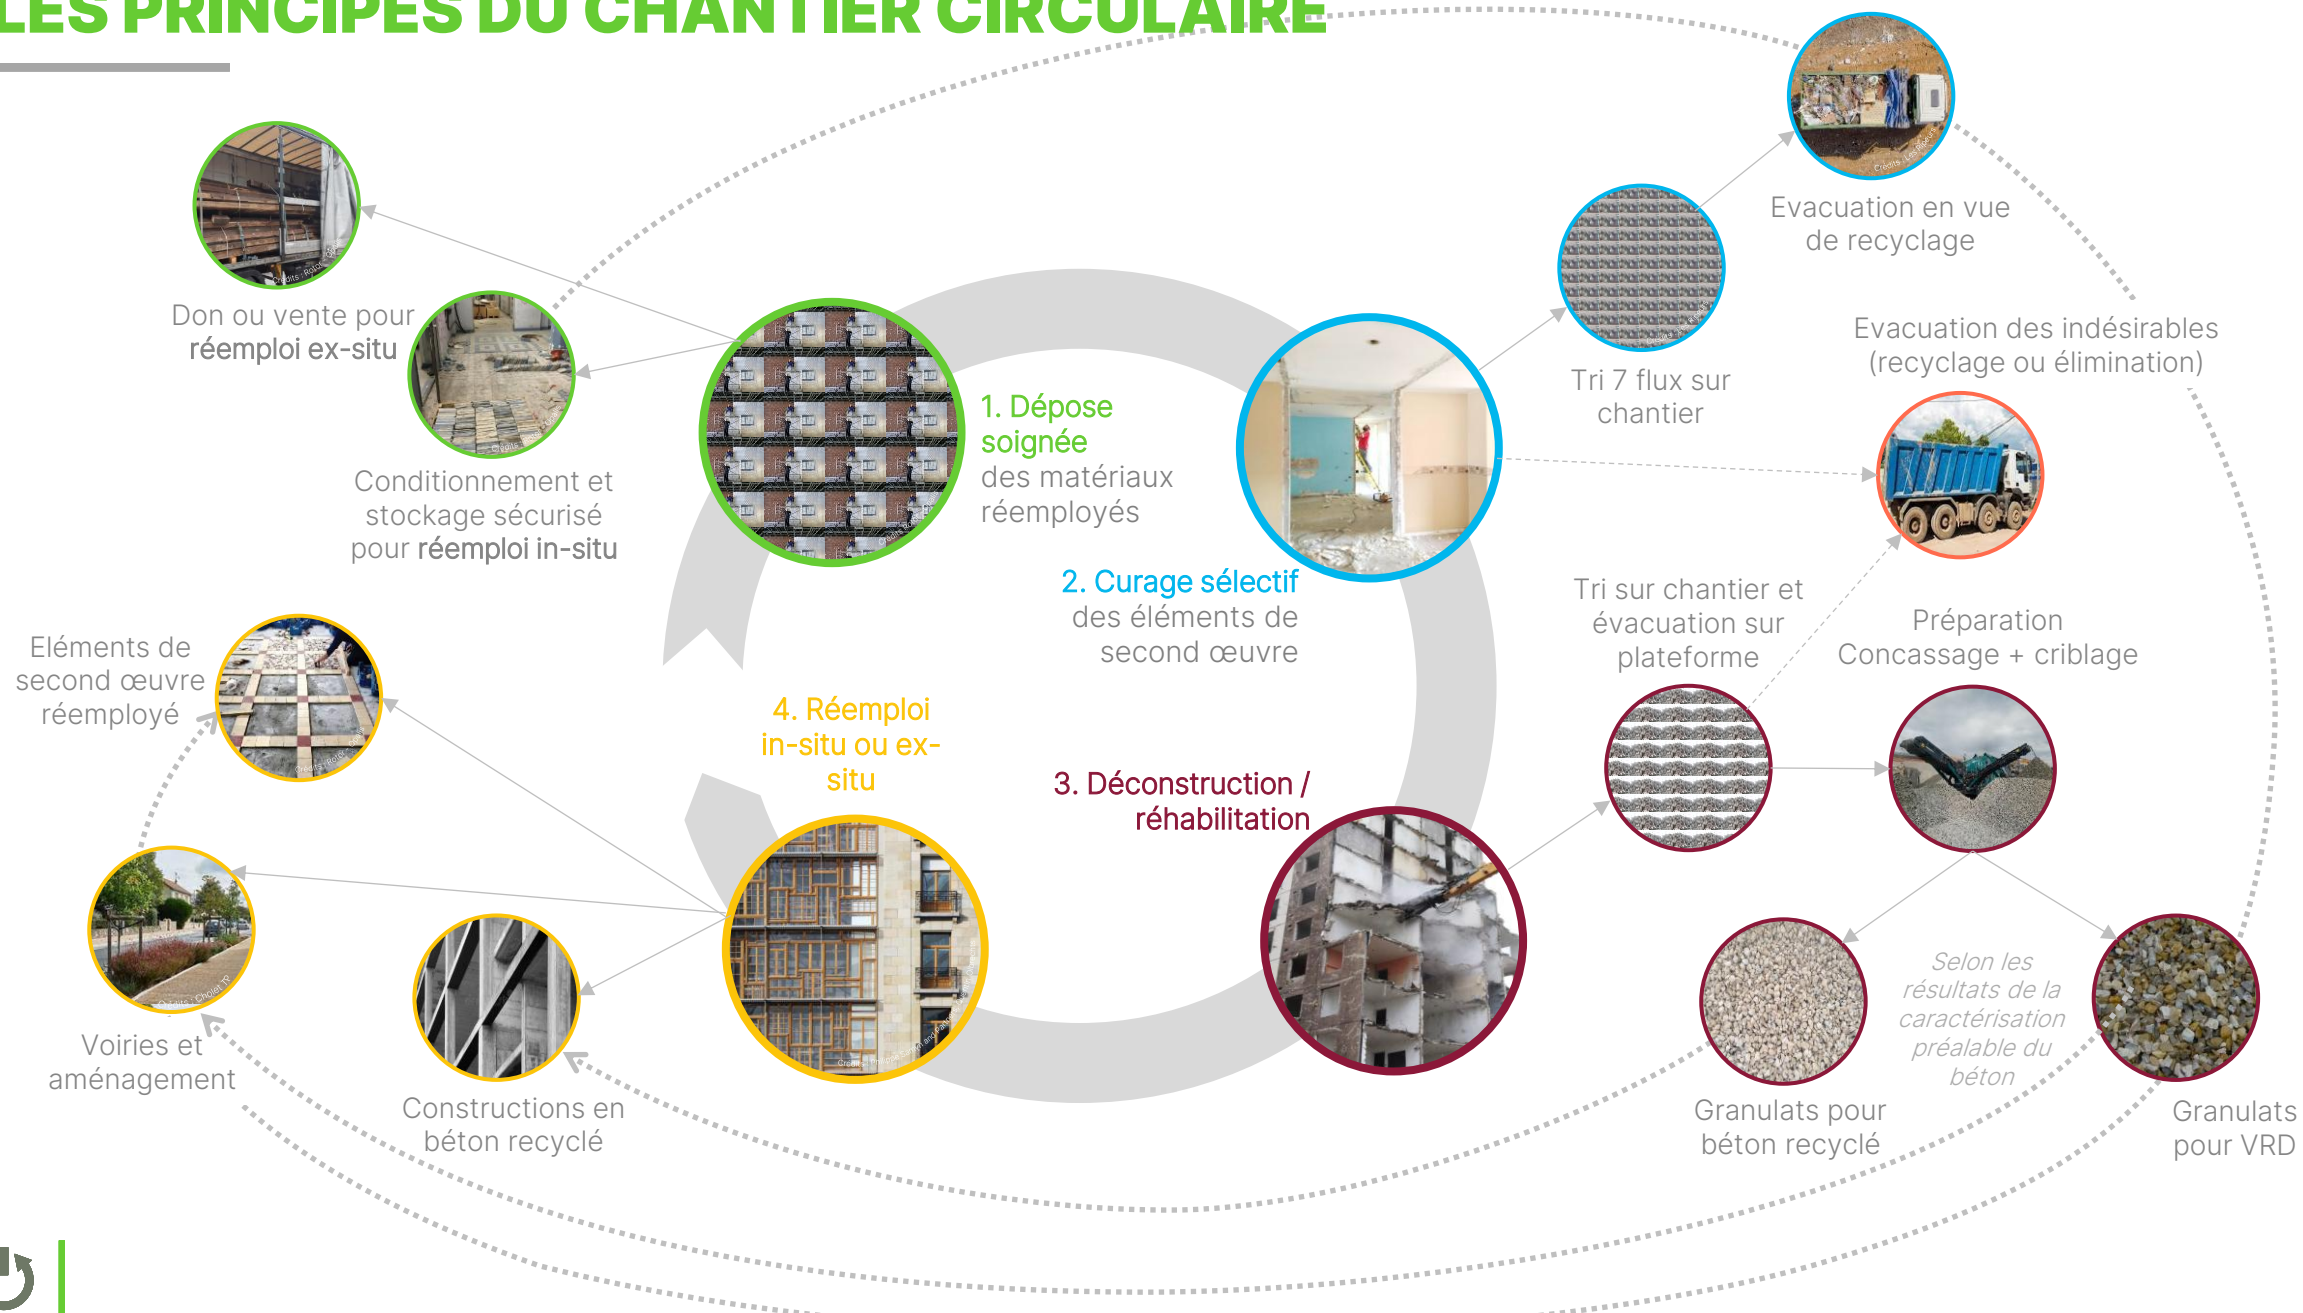



REX – PHASE CHANTIER

Dépose du porche extérieur



Méthodologie de dépose :


Désassemblage manuel des différents éléments de la structure du porche.



Bois du porche stocké chez l'Officine du réemploi après préparation

REX – PHASE CHANTIER

Test de dépose des parquets

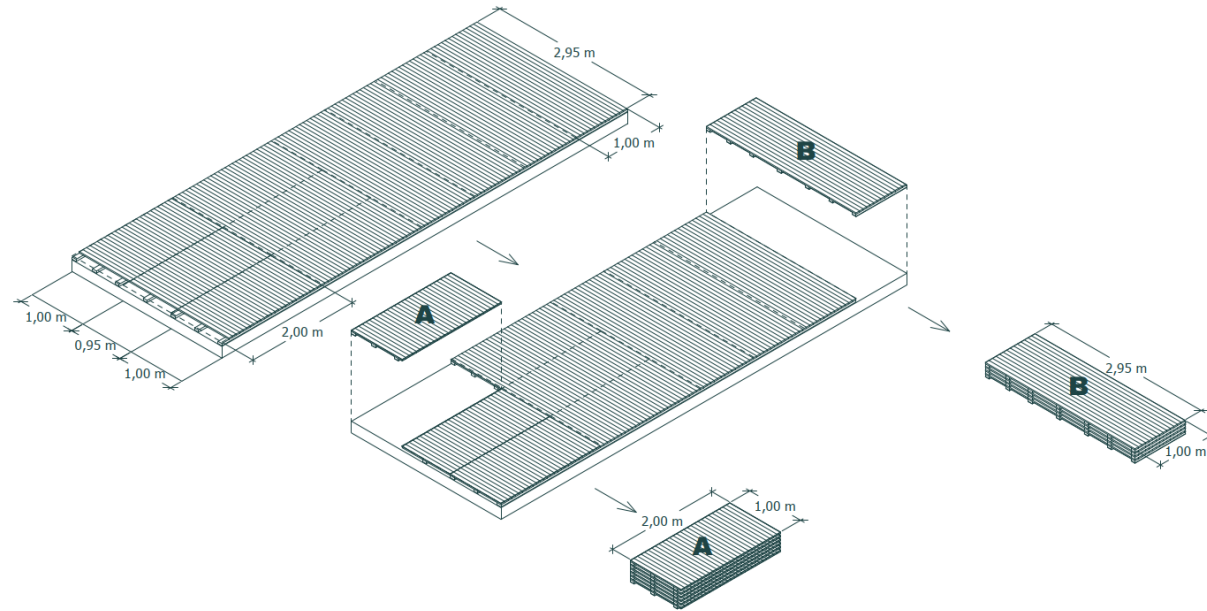

R-USE



Méthodologie de dépose :

Découpe de plaque de parquet minimum 2mx1m

Objectifs : accélérer la cadence de dépose, limiter les chutes et la casse lors de la dépose, détourner l'usage initial du parquet



« Plaque » de parquet stocké sur chantier

REX – PHASE CHANTIER

Réemploi des tuiles / Réemploi de charpente bois



Méthodologie de dépose :

Dépose manuelle des tuiles et stockage en l'état dans des palettes

Repreneur : Artisan couvreur pour des projets de maison de particulier



Méthodologie de dépose :

Dépose à la pince des éléments de charpente pré identifiés lors des visites

Repreneur : Darwin Woodstock / récupération sur chantier / utilisation du bois via le réseau Réembois

Produits – Réembois



REX – PHASE CHANTIER


Filière de valorisation



FILIÈRE BOIS




FILIÈRE DND

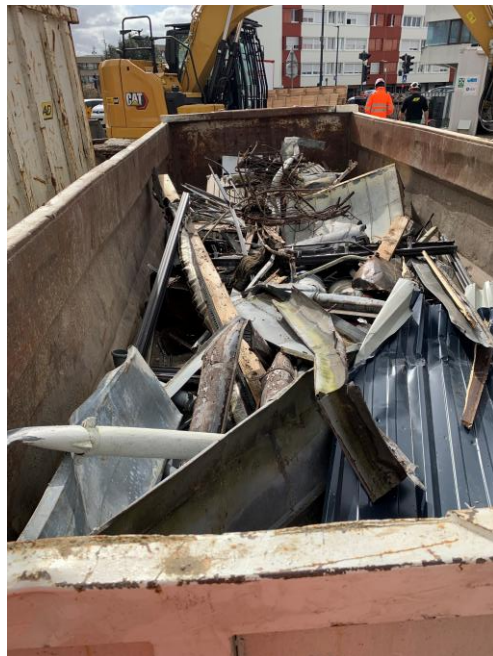

FILIÈRE MÉTAUX



BRIQUE PLÂTRIÈRE

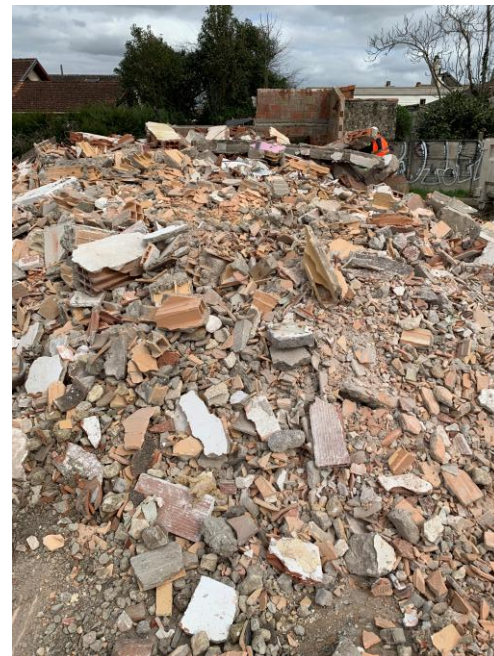

INERTE EN
MÉLANGE

REX – PHASE CHANTIER

Bilan de la démarche économie circulaire



Points positifs et bonnes pratiques

- ▶ Visite de site avec les repreneurs en phase de préparation du chantier
- ▶ Méthodologie de dépose adapté au projet, pas de difficulté particulière pour les tuiles ou les charpentes
- ▶ Test d'une nouvelle méthodologie de dépose pour les parquets (économie cout de dépose et nouvelle usage)
- ▶ Travail en collaboration avec acteurs de la filière bois
- ▶ Outils de traçabilité bien pris en main par l'entreprise travaux
- ▶ Bonne communication entre l'ensemble des repreneurs et l'entreprise travaux ce qui a permis de fluidifier la démarche réemploi
- ▶ Repreneur réemploi efficace et opérationnel pour la reprise des matériaux sur site



Difficultés et points à améliorer

- ▶ Problème logistique avec les 1^{er} repreneur tuiles (changement de repreneur en cours de chantier)
- ▶ Manque de visibilité sur les exutoires de la brique plâtrière
- ▶ Connaissance du planning (très changeant à cause des aléas climatiques) pour être présent lors des déposes clés
- ▶ Manque de précision des diagnostic termites



4



BILAN

RÉEMPLOI

Bilan du réemploi effectif

10,15 t de matériaux réemployés soit **1%** de la quantité de matériaux générée par le chantier

- ▶ Éléments de charpente bois
- ▶ Tuiles terre cuite
- ▶ Parquet bois

3,31 TCO₂eq économisé grâce au réemploi des équipements déposés*

14% du bois déconstruit a été réemployé



Nom de l'élément	Quantité déposée	Unité	Destination
Structure porche extérieur bois	9	u	Officine du réemploi
Tuile toiture 56	135	m ²	La Bonne Echarde
Parquet bois	45	m ²	Collectif FLIP
Charpente bois Pelletan	7	u	Darwin Woodstock
Charpente bois Kennedy	52	u	Darwin Woodstock

4 repreneurs différents



RECYCLAGE

Principales filières de valorisation des déchets produits durant le chantier



INERTES en mélange



METAUX



BOIS



DIVERS

Quantité de matériaux (t)	1 045,9t	2,76 t	21,22 t	28,54 t
Type de valorisation	Valorisation en graves pour VRD	Tri sur site dans une benne spécifique Destination : Valorisation matière	Tri sur site dans une benne spécifique Destination : CSR	Benne en mélange Surtri sur plateforme pour récupérer les fractions valorisables
Nombre de maillon dans la chaîne de valorisation	1 Plateforme de préparation des matériaux SDC	3 Plateforme de regroupement Centre de préparation de la matière Usine de valorisation matière (haut fourneaux)	2 Plateforme de regroupement Usine de production de Combustible Solide de Récupération (CSR)	4 Plateforme de regroupement et de surtri pour valorisation (3) Envois en filière valo matière Envois en filière valo énergétique (UVE Bègles) Envois en enfouissement (ISDND K2 à Clérac)

RECYCLAGE

Le bilan quantitatif

En synthèse :

1098,42 t de déchets générés

96,5 % de valorisation matière

3 exutoires de recyclage alimentés par l'opération

103 Transport réalisés par les différents prestataires pour évacuer l'ensemble des déchets

10 km de transport pour atteindre le 1^{er} centre de traitement en moyenne*

Répartition par types de valorisation
(hors déchets dangereux et terres polluées)

